


■工程表

	2023年 (R5年)				2024年 (R6年)												2025年 (R7年)												2026年 (R8年)		
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
工場棟 地下 建築工事																															
工場棟 地上 建築工事																															
工場棟 プラント工事																															
管理棟・計量棟 建築工事																															
外構工事																															
試運転																															
備 考	10/2 着工				79.0% (進捗率)																								2/13 竣工		

■工事進捗イメージ

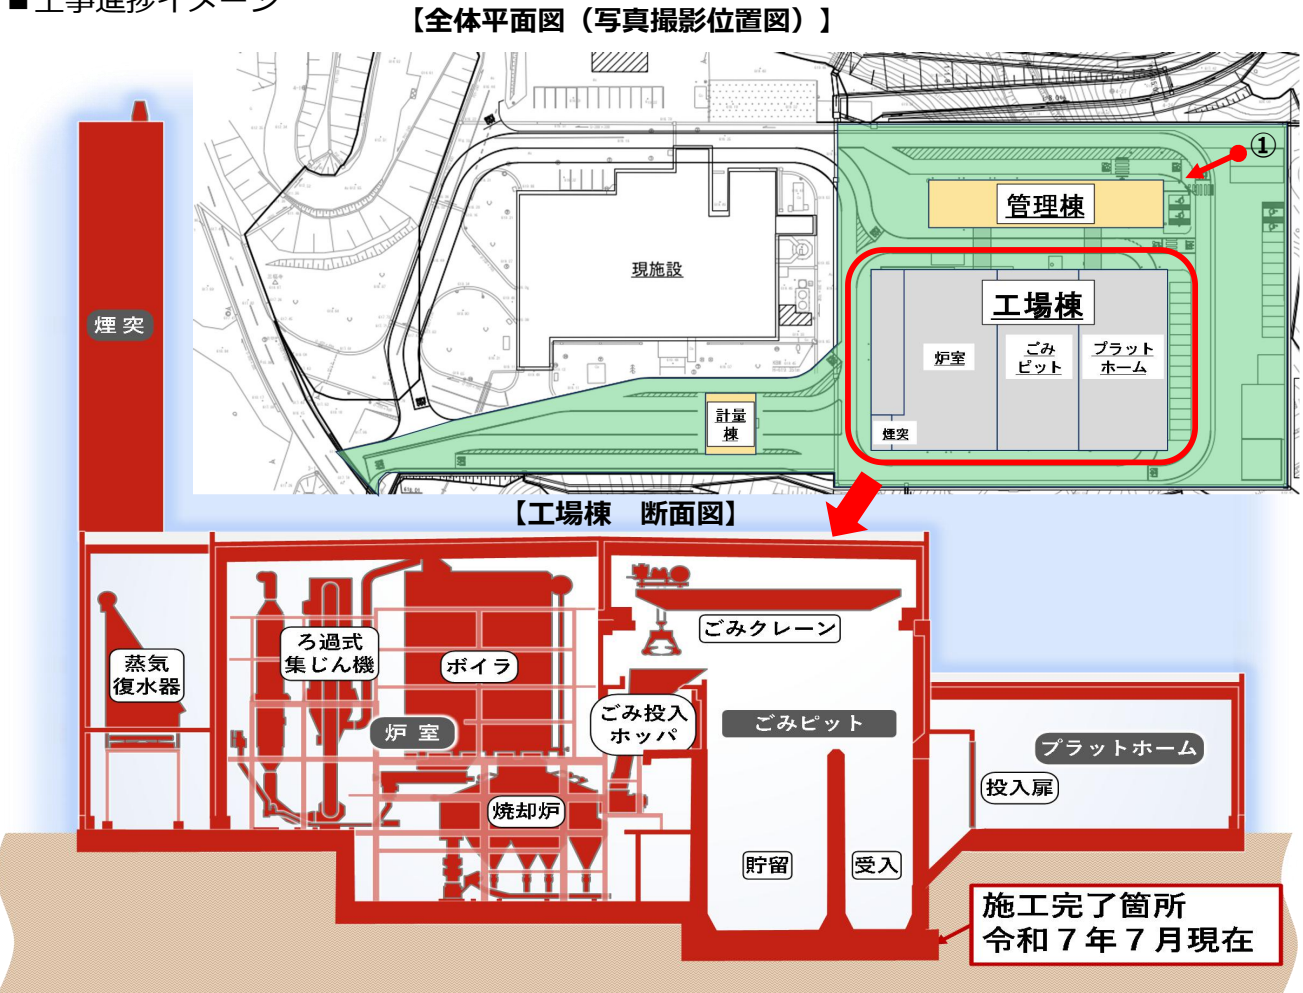

■今後の予定


令和7年	9月	受電（新施設へ電気を通すこと）、消防検査
	10月	建築確認完了検査、試運転開始
	11月	ごみ受け入れ開始、負荷運転開始
	12月	ごみ焼却開始
令和8年	2月	施設建設工事完成

進捗状況はこちらのHPでも



■工事状況写真

・航空写真（令和6年9月）①方向

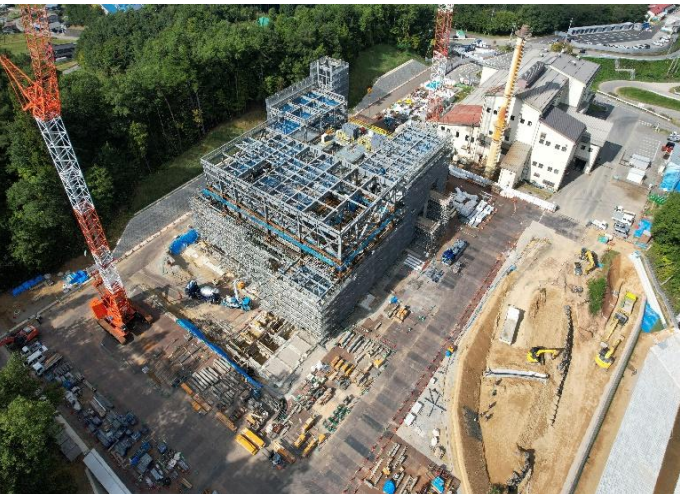

・航空写真（令和6年11月）①方向



・航空写真（令和7年1月）①方向



・航空写真（令和7年3月）①方向



・航空写真（令和7年5月）①方向



・航空写真（令和7年6月）①方向

